



LIFE+ 2011



LIFE+ Environment Policy and Governance project application

MAKING PUBLIC GOODS PROVISION: THE CORE BUSINESS OF NATURA 2000

2 Ottobre 2012 - Kickoff meeting

SCHEMA LOGICO DEL PROGETTO DEL PROGETTO LIFE+ : “Making public goods provision the core business of Natura 2000”

Obiettivo generale
cui il progetto
contribuisce

Contribuire all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e legislazione ambientale europea, inclusa l'integrazione delle tematiche ambientali nelle altre politiche contribuendo allo sviluppo sostenibile

Obiettivo specifico
del progetto

Migliorare gestione siti
agroforestali N2000 con
strumenti e processi innovativi
basati su PES

Risultati attesi
a fine progetto

Aver creato dimostrato
applicato un modello di
autofinanziamento e
governance in siti pilota

Aver prodotto e diffuso
strumento e manuale x
applicare altrove il
modello

Creato
consapevolezza sul
valore economico e
sociale siti N2000
agroforestali

Contribuito alle
politiche 2013-2020 su
integrazione di
problematiche
ambientali e agricole

Azioni
necessarie

A2, A3, B1, B2, B3,
B4-B9


B10, B11, D2, E5

D1, D3, D4, E1, E2,
E5, E6

E2, B11

Attività di supporto al progetto: A1, C1, C2, E3, E4

QUADRO GENERALE DEL PROGETTO LIFE+ :
“Making public goods provision the core business of Natura 2000”

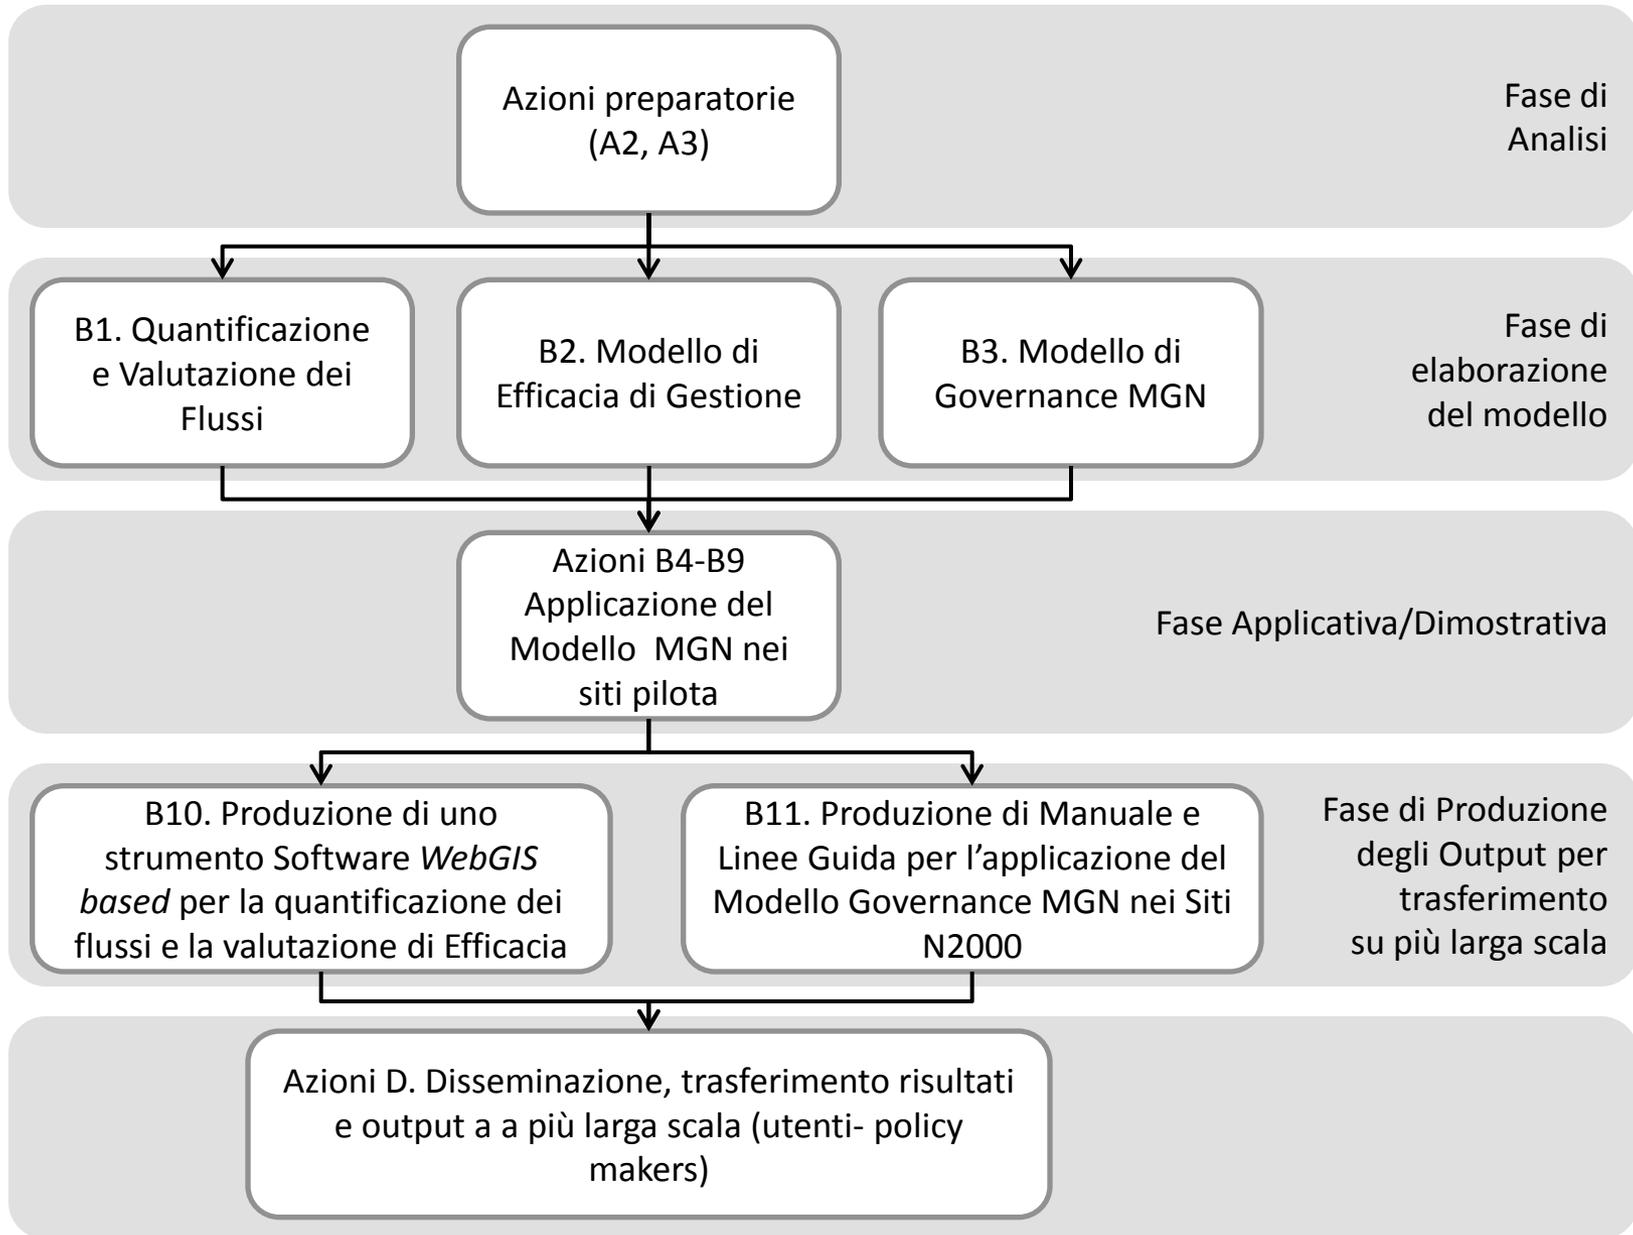

Azioni di gestione, monitoraggio e comunicazione

AZIONI DI PROGETTO

A 1	Avvio del progetto
A 2	Analisi dei servizi ecosistemici nei siti pilota
A 3	Analisi della gestione e dei finanziamenti riguardo ai servizi ecosistemici nei siti pilota
B 1	Modello dimostrativo di valutazione qualitativa e quantitativa dei servizi ecosistemici nei siti pilota
B 2	Modello dimostrativo di valutazione dell'efficacia di gestione dei siti pilota
B3	Modello dimostrativo di governance dei siti MAKING GOOD NATURA basato su PES e forme di autofinanziamento
B4 – B9	Applicazione dimostrativa del modello di governance MAKING GOOD NATURA nei siti pilota
B10	Software per la valutazione e quantificazione dei servizi ecosistemici
B11	Manuale per l'applicazione del modello di governance MAKING GOOD NATURA
C1	Monitoraggio dell' impatto del progetto sugli indicatori scelti
C2	Monitoraggio dell' impatto socio-economico del progetto
D1	Sito internet del progetto
D2	Piattaforma virtuale di assistenza per i soggetti terzi
D3	Piano di comunicazione e materiale informativo del progetto
D4	Eventi di comunicazione pubblica a scala locale e nazionale
E1	Gestione e coordinamento generale del progetto
E2	Comitato di pilotaggio
E3	Monitoraggio dell' andamento del progetto
E4	Revisione indipendente del rapporto finanziario finale
E5	Piano di comunicazione post Life +
E6	Attività di network con simili esperienze a livello Europeo

QUADRO DEGLI ATTORI DEL PROGETTO

CURSA

Coordinamento scientifico e amministrativo, elaborazione e trasferimento modello

WWF

EURAC

WWF RP

Partner con competenze scientifiche e gestionali specifiche x elaborazione e trasferimento modello

Regione Lombardia

Regione Siciliana

Parco Naz. Pollino

Ersaf

Parco Interreg.SSS

Parco Naz. Cilento

Partner Territoriali (e di gestione) per dimostrazione del modello
In realtà diverse

Ministero Ambiente

Ministero Agricoltura

Portatori di interesse

Attori esterni al partenariato ma interni al Comitato pilotaggio
Per input al progetto e trasferimento su più larga scala

Coinvolgimento nelle azioni (corrispondenti al budget)

		Corsa	Eurac	Wwf	Wwfip	Lombardia	Ersaf	Sicilia	Pollino	Cilento	Sasso
Avvio del progetto	A1										
Analisi dei servizi ecosistemici nei siti pilota	A2										
Analisi della gestione e dei finanziamenti riguardo ai servizi ecosistemici nei siti pilota	A3										
Modello dimostrativo di valutazione qualitativa e quantitativa dei servizi ecosistemici nei siti pilota	B1										
Modello dimostrativo di valutazione dell'efficacia di gestione dei siti pilota	B2										
Modello dimostrativo di governance dei siti MAKING GOOD NATURA basato su PES e forme di autofinanziamento	B3										
Applicazione dimostrativa del modello nella REGIONE LOMBARDIA	B4										
Applicazione dimostrativa del modello nei siti pilota dell'ERSAF	B5										
Applicazione dimostrativa del modello nella REGIONE SICILIANA	B6										
Applicazione dimostrativa del modello nel PARCO NAZIONALE DEL POLLINO	B7										
Applicazione dimostrativa del modello nel PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO	B8										
Applicazione dimostrativa del modello nel PARCO NATURALE SASSO E SIMONCELLO	B9										
Software per la valutazione e quantificazione dei servizi ecosistemici	B10										
Manuale per l'applicazione del modello di governance MAKING GOOD NATURA	B11										
Monitoraggio dell'impatto del progetto sugli indicatori scelti	C1										
Monitoraggio dell'impatto socio-economico del progetto	C2										
Sito internet del progetto	D1										
Piattaforma virtuale di assistenza per i soggetti terzi	D2										
Piano di comunicazione e materiale informativo del progetto	D3										
Eventi di comunicazione pubblica a scala locale e nazionale	D4										
Gestione e coordinamento generale del progetto	E1										
Comitato di pilotaggio	E2										
Monitoraggio dell'andamento del progetto	E3										
Revisione indipendente del rapporto finanziario finale	E4										
Piano di comunicazione post Life +	E5										
Attività di network con esperienze su tematiche simili a livello Europeo	E6										

responsabile azione (costi in budget)
 collabora in azione (costi in budget)
 collabora in azione (senza budget)

TIMETABLE

Tick as appropriate.

Action		2012			2013			2014			2015			2016			2017		
		II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Action number	Name of the action																		
A. Preparatory actions:																			
A.1	Avvio del progetto		■	■															
A.2	Analisi dei servizi ecosistemici nei siti pilota			■	■	■	■												
A.3	Analisi della gestione e dei finanziamenti riguardo ai servizi ecosistemici nei siti pilota			■	■	■													
B. Implementation actions:																			
B.1	Modello dimostrativo di valutazione qualitativa e quantitativa dei servizi ecosistemici nei siti pilota				■	■	■	■	■										
B.2	Modello dimostrativo di valutazione dell'efficacia di gestione dei siti pilota				■	■	■	■	■										
B.3	Modello dimostrativo di governance dei siti MAKING GOOD NATURA basato su PES e forme di autofinanziamento				■	■	■	■	■										
B.4	Applicazione dimostrativa del modello di governance MAKING GOOD NATURA nei siti pilota della Regione Lombardia								■	■	■	■	■	■					
B.5	Applicazione dimostrativa del modello di governance MAKING GOOD NATURA nei siti pilota dell'ERSAF								■	■	■	■	■	■					
B.6	Applicazione dimostrativa del modello di governance MAKING GOOD NATURA nei siti pilota della Regione Siciliana								■	■	■	■	■	■					
B.7	Applicazione dimostrativa del modello di governance MAKING GOOD NATURA nei siti pilota del Parco Nazionale del Pollino								■	■	■	■	■	■					
B.8	Applicazione dimostrativa del modello di governance MAKING GOOD NATURA nei siti pilota del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano								■	■	■	■	■	■					
B.9	Applicazione dimostrativa del modello di governance MAKING GOOD NATURA nei siti pilota del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello								■	■	■	■	■	■					
B.10	Strumento per la valutazione e quantificazione dei servizi ecosistemici									■	■	■	■	■	■				
B.11	Manuale per l'applicazione del modello di governance MAKING GOOD NATURA									■	■	■	■	■	■				
C. Monitoring of the impact of the project actions:																			
C.1	Monitoraggio dell'impatto del progetto sugli indicatori scelti				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C.2	Monitoraggio dell'impatto socio-economico del progetto				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D. Communication and dissemination actions:																			
D.1	Sito internet del progetto				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D.2	Piattaforma virtuale di assistenza per i soggetti terzi									■	■	■	■	■	■				
D.3	Piano di comunicazione e materiale informativo del progetto				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D.4	Eventi di comunicazione pubblica a scala locale e nazionale				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E. Project management and monitoring of the project progress:																			
E.1	Gestione e coordinamento generale del progetto		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.2	Comitato di pilotaggio		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.3	Monitoraggio dell'andamento del progetto		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.4	Revisione indipendente del rapporto finanziario finale		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.5	Piano di comunicazione post Life +										■	■	■	■					
E.6	Attività di network con simili esperienze a livello Europeo		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Do you want to show "TimeTable" for years 2018 - 2023? Yes No

DELIVERABLE PRODUCTS OF THE PROJECT

Name of the Deliverable (max. 50 characters)	Number of the associated action	Deadline		
Verbale incontro di avvio del progetto	A.1	21-12-2012	-	+
Allegato composizione del Comitato di pilotaggio	A.1	21-12-2012	-	+
Allegato composizione della Cabina di Regia	A.1	21-12-2012	-	+
Prima versione del sito web del progetto	D.1	21-12-2012	-	+
Pieghevoli	D.3	21-12-2012	-	+
Check list SE dei siti Natura 2000	A.2	28-06-2013	-	+
Report su risultati azione	A.3	28-06-2013	-	+
Report riunione Cabina di Regia	E.1	28-06-2013	-	+
Report riunione Cabina di pilotaggio	E.2	28-06-2013	-	+
Brochure	D.3	30-09-2013	-	+
Piano di Monitoraggio	C.1	30-09-2013	-	+
Piano di Monitoraggio impatto socio economico	C.2	30-09-2013	-	+
Report attività monitoraggio	C.1	20-12-2013	-	+
Report riunione Cabina di Regia	E.1	20-12-2013	-	+
Report riunione Cabina di pilotaggio	E.2	20-12-2013	-	+
Report di valutazione del progetto	E.4	20-12-2013	-	+
Report WEBGIS	B.1	28-03-2014	-	+
Report analisi enti gestori	B.2	28-03-2014	-	+
Report governance dei siti	B.3	28-03-2014	-	+
Report riunione Cabina di Regia	E.1	30-06-2014	-	+
Report riunione Cabina di pilotaggio	E.2	30-06-2014	-	+
Report questionario impatto progetto	C.2	19-12-2014	-	+
Report attività monitoraggio	C.1	19-12-2014	-	+
Report riunione Cabina di Regia	E.1	19-12-2014	-	+
Report riunione Cabina di pilotaggio	E.2	19-12-2014	-	+

Name of the Deliverable (max. 50 characters)	Number of the associated action	Deadline		
Report di valutazione del progetto	E.4	19-12-2014	-	+
Report riunione Cabina di Regia	E.1	30-06-2015	-	+
Report riunione Cabina di pilotaggio	E.2	30-06-2015	-	+
Chiavette USB (pen drive)	D.3	30-09-2015	-	+
Report Modello MGN RL	B.4	30-09-2015	-	+
Report Modello MGN ERSAF	B.5	30-09-2015	-	+
Report Modello MGN DRARFD	B.6	30-09-2015	-	+
Report Modello MGN PNP	B.7	30-09-2015	-	+
Report Modello MGN PNCVD	B.8	30-09-2015	-	+
Report Modello MGN PARCOSASSO	B.9	30-09-2015	-	+
Manuale per applicazione strumento	B.10	30-09-2015	-	+
Manuale per la governance	B.11	30-09-2015	-	+
Report attività monitoraggio	C.1	15-06-2016	-	+
Layman's report	D.3	15-06-2016	-	+
Report eventi di comunicazione pubblica	D.4	23-12-2015	-	+
Report riunione Cabina di Regia	E.1	23-12-2015	-	+
Report riunione Cabina di pilotaggio	E.2	23-12-2015	-	+
Report di valutazione del progetto	E.4	15-06-2016	-	+
Piano di Comunicazione post LIFE+	E.5	15-06-2016	-	+
Rassegna stampa del progetto	E.1	15-06-2016	-	+

MILESTONES OF THE PROJECT

Name of the Milestone (max. 50 characters)	Number of the associated action	Deadline		
Incontro di avvio del progetto	A.1	21-12-2012	-	+
Nomina staff e Cabina di Regia	E.1	21-12-2012	-	+
Completamento check list siti Natura 2000	A.2	28-06-2013	-	+
Individuazione degli stakeholder dei siti	A.3	28-06-2013	-	+
Avvio piattaforma di assistenza	D.2	20-12-2013	-	+
Elaborazione strumento software	B.1	31-03-2014	-	+
Analisi dell'efficacia di gestione dei siti	B.2	31-03-2014	-	+
Definizione del modello di governance	B.3	31-03-2014	-	+
Formazione interna per applicazione Modello	B.4	31-03-2014	-	+
Formazione interna per Manuale software	B.10	30-06-2014	-	+
Applicazione dimostrativa del Modello MGN RL	B.4	30-09-2015	-	+
Applicazione dimostrativa del Modello MGN ERSAF	B.5	30-09-2015	-	+
Applicazione dimostrativa del Modello MGN DRARFD	B.6	30-09-2015	-	+
Applicazione dimostrativa del Modello MGN PNP	B.7	30-09-2015	-	+
Applicazione dimostrativa del Modello MGN PNCVD	B.8	30-09-2015	-	+
Applicazione dimostrativa del Modello MGN PARCOSAS	B.9	30-09-2015	-	+
Redazione Manuale di applicazione del software	B.10	18-12-2015	-	+
Completamento Manuale governance	B.11	18-12-2015	-	+
Evento di Comunicazione nazionale Roma	D.4	23-12-2015	-	+
Organizzazione seminario internazionale	E.6	23-12-2015	-	+

ACTIVITY REPORTS FORESEEN


Please indicate the deadlines for the following reports:

- Inception Report (to be delivered within 9 months after the project start);
- Progress Reports n°1, n°2 etc. (if any; to ensure that the delay between consecutive reports does not exceed 18 months);
- Mid-term Report with payment request (only for project longer than 24 months);
- Final Report with payment request (to be delivered within 3 months after the end of the project);

Type of report	Deadline	-	+
Inception Report	31-05-2013	-	+
Progress Report	28-02-2014	-	+
Mid-term Report	30-04-2014	-	+
Progress Report	31-08-2015	-	+
Final Report	15-09-2016	-	+

Piano degli eventi generali/riunioni															dove:	Roma		Lombardia	PNCVD
Azione	Evento	2012		2013				2014				2015							
		3 trim	4 trim	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim				
A1	Avvio del progetto		*																
B4 - B9	Formazione interna x applicazione modello IIGN							*											
B10 - B11	Formazione interna x strumento e manuale												*						
D4	2 eventi a scala nazionale								*						*				
E1	6 Riunioni Cabina di Regia				*		x		*		x		*		*				
E2	6 Riunioni Comitato di Pilotaggio				*		x		*		x		*		*				

Azione E1. Gestione e Coordinamento del Progetto

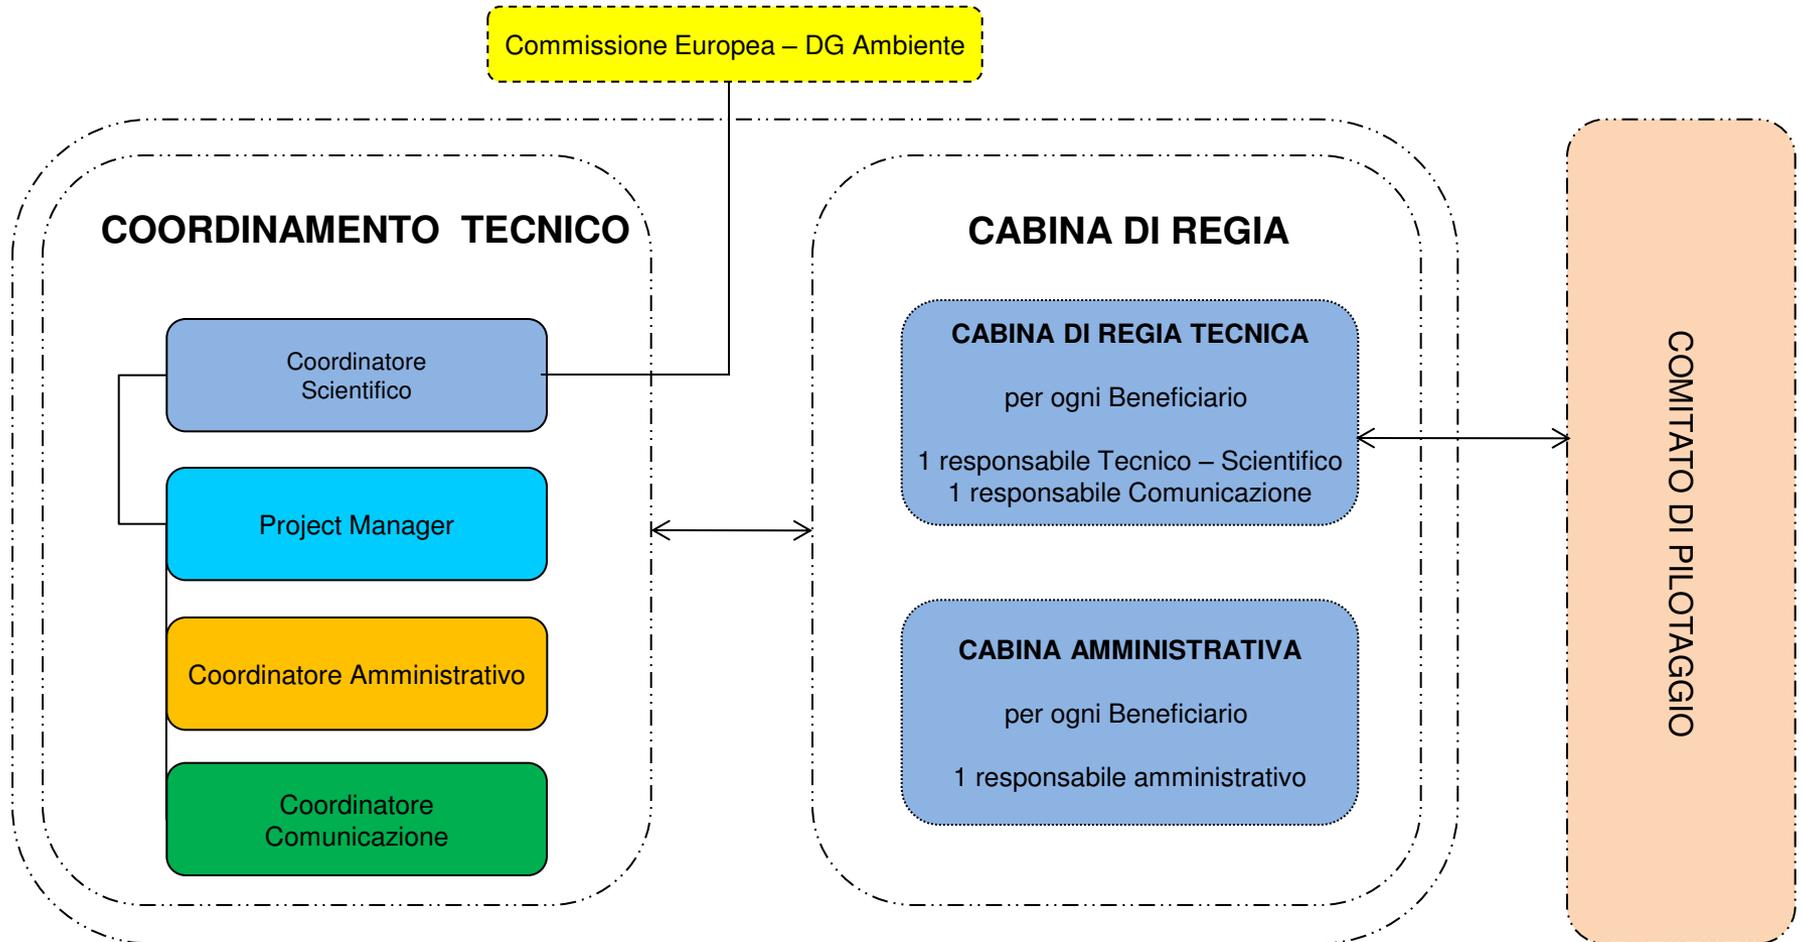

Azione E2. Comitato di Pilotaggio del progetto

